


Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Напредък за 2013 г.

пътят на водата



3 декември 2013 г.



Изпълняват се всички пет
строителни договора в рамките на проекта:

реконструкция на пречиствателна станция за питейни води

три етапа на рехабилитация на водоснабдителна мрежа -
76,5 км, разширяване на канализационна мрежа -18,5 км,
рехабилитация на канализационна мрежа - 21,6 км, ремонт
на помпени станции

реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни
води



Общата стойност на петте строителни
договора е 84 228 326, 86 лв. с ДДС,

ОТ КОИТО:

Реконструкция на ПСПВ	12 406 891, 21 лв.
Етап 1 ВиК мрежи	16 636 878, 42 лв.
Етап 2 ВиК мрежи	17 614 546, 93 лв.
Етап 3 ВиК мрежи	14 359 713, 62 лв.
Реконструкция на ПСОВ	23 210 296, 68 лв.

от които 79.4 млн. лв. с ДДС е стойността по ОПОС

пътят на водата



ПЪРВА КОПКА НА ПРЕЧИСТАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – 14.06.2013 Г.



пътят на водата



ПЪРВА КОПКА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ – 23.09.2013 Г.





Към момента е приключила фазата на проектиране, издадено е разрешение за строеж, изпълняват се строителни работи на двете станции.



ДОГОВОРИ ЗА ВИК МРЕЖАТА

До момента са изпълнени:

общо **83 км ВиК мрежи**,

т.е. повече от половината от общия обем
116.6 км



ОТ КОИТО:

20 км изпълнена канализация

63 км изпълнен водопровод



Завършени са новите помпена станция, тласкател и напорен водоем на кв. Стефановци, в рамките на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово. Старата помпена станция тласка вода директно в мрежата и при спиране на ел. захранването се преустановява и водоподаването. Новоизградената помпена станция е обезпечена с ново електрическо и механично оборудване, по – добра автоматика и режим на работа на помпите. Напорният резервоар осигурява резервно водоподаване при аварийни ситуации, както и противопожарен обем вода. Станцията ще бъде въведена в експлоатация след изпълнение на водопроводната мрежа на кв. Стефановци.

пътят на водата





ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

НА НАСТИЛКИ В ОБХВАТА НА ПРОЕКТА



Ключов акцент от инвестициите на Община Габрово във ВиК мрежата, е съвместяването им с други важни благоустройствени намерения. Предвид на това, че състоянието на повечето улични настилки е изключително лошо, а по част от тях се предвижда изграждането на два и повече провода, успоредно с направата на няколко траншейни изкопа, Община Габрово е предвидила допълнителни инвестиции за цялостното им възстановяване.

Разходите, които се финансират от Оперативна програма „Околна среда“ за проекта, включват само възстановяването на траншеята на изкопите. По тази причина се налага дофинансиране (в участъците извън траншеите) на цялостното възстановяване на голяма част от улиците, тъй като, съгласно правилата на европейското финансиране, проектът покрива само възстановяването на изкопите, където са положени проводите.



За финансиране на инвестициите в
улични настилки, Община Габрово
ще ползва дългосрочен инвестиционен кредит
в размер на 3 770 000 лв. от ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО
САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ФЛАГ за възстановяване на
(съгласно предварително изготвена ориентировъчна
количествена сметка):

152 625 м² асфалтови настилки,

4 691 м² паважни настилки,


26 428 м² тротоарни настилки,

19 564 м бордюри

по улици, където е подменена ВиК мрежата по проекта.

Ул. Морава

пътят на водата

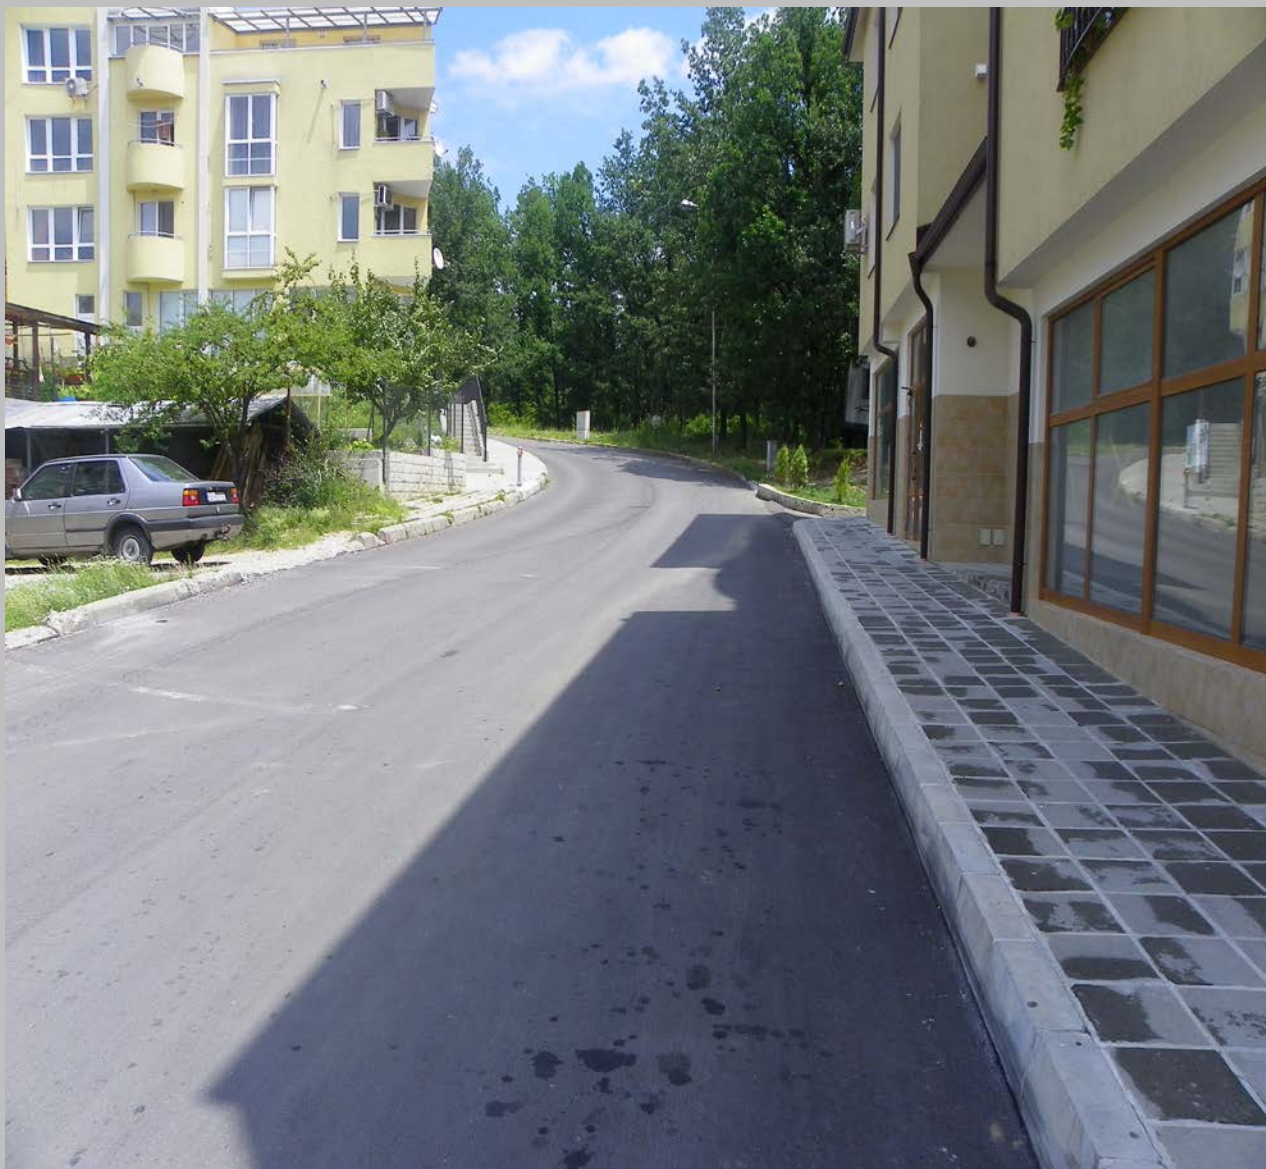

пътят на водата



Ул. Цанко Церковски



пътят на водата

Ул. Василка Бенева



пътят на водата



Ул. Гимназиална



пътят на водата

Ул. Пенчо Постомпиров



пътят на водата

Ул. Хаджи Димитър



пътят на водата



Ул. Орлово гнездо



пътят на водата

Ул. Добри Карталов



пътят на водата

Ул. Иван Вазов



пътят на водата

Ул. Лазар Донков



пътят на водата

Ул. Драва



пътят на водата

Ул. Македония





Ул. Македония



пътят на водата

Ул. Селимица



пътят на водата

Ул. Георги Стефанов



пътят на водата

Ул. Васил Друмев



пътят на водата

Ул. Обзор



пътят на водата

Ул. Стръмнина



пътят на водата

Ул. Брегалница



пътят на водата



Ул. Алеко Богориди



пътят на водата



Ул. Тодор Бурмов





АКЦЕНТИ:

В края на лятото на 2013 г. проектът отбелязва добър физически напредък по отношение на полагане на проводите и Община Габрово издаде разпореждания за приоритетна работа по подготовка за предстоящия зимен сезон.

Това включва:

ограничаване на броя на отворените изкопи;

възстановяване на улични настилки;

изравняване на шахти и подсипване на спирателни кранове;

изравняване на улични платна, в т.ч. и по напречни прокопавания;

цялостна завършеност на започнатите участъци.



АКЦЕНТИ:

Към началото на зимния сезон, част от обектите, разположени по възлови пътни артерии в Габрово не бяха завършени на етап възстановяване на настилки.

След обстоен оглед, от фирмите изпълнители бе изискано да работят приоритетно по поддържане на обектите в подходящ за зимна обстановка вид.



Това включва:

Привързване на сгради отклонения;

Обезопасяване на изкопи – включително поставяне на липсващи ограждения и светлинна сигнализация;

Засипване на изкопи, където съображенията за сигурност го налагат;

Постоянно наблюдение и поддръжка на обектите от страна на изпълнителите, с цел осигуряване на проходимост и необходимите за снегопочистване условия.



ЕТАП 1

ДРАГИЕВ И КО ООД

Начало на строителството: 05.06.2012 г.

Край на строителството: 04.05.2014 г.

Стойност на договора – 16.6 млн. лв. - обща стойност; 14.7 млн. лв. с ДДС – стойност по ОПОС



Етап 1 – изпълнени са:

Кв. Баждар и кв. Варовник – водопроводи по улици Е. Манолов, Х. Димитър, Цанко Церковски, Г. Кръстевич, А. Богориди, Т. Бурмов, Тракия, Омуртаг, П. Яворов, Добруджа, част от тласкател 1 и 2, част от К. Величков, Ал. Константинов, Варовник, А. Кънчев, Стръмнина, В. Друмев, Обзор. 8 от улиците са възстановени с асфалтова настилка. Останалите са чакълирани. Улиците са проходими, с изключение на ул. Тракия и част от ул. Х. Димитър, които са затворени поради извършване на работа по настилките с цел възстановяване на паваж по ул. Х. Димитър, премахване на настилка и засипване с чакъл, и уплътняване за зимния сезон по ул. Тракия.

Кв. Голо бърдо – водопроводи по бул. Могилъов, улици Венера, Свищовска – възстановена е асфалтовата настилка. Улиците са проходими.

Кв. Русевци – водопроводи по улици Н. Геров, Морава, Брегалница, Селимица, Емине, Околчица, Цветарска – възстановени са настилките. Улиците са проходими.



Кв. Трендафил – водопроводи по улици Венец, Люлякова градина, част от ул. Найденов Геров. Улиците са проходими. Изпълняват се СМР по ул. Н. Рязков, която е проходима.

Кв. VI участък – водопровод по улици М. Дринов, Цар Калоян, Орлово гнездо, Трапезица, Н. Палаузов, Отец Паисий, Й. Предтеча, Опълченска, Козлудуй, Е. Цанков, П. Славеков, Мусала, Р. Умников. Улиците са проходими. Предстои възстановяване на настилките по друг проект с изключение на улици Орлово гнездо, Трапезица и Е. Цанков, които са възстановени по водния цикъл.

Кв. Стефановци и кв. Златари – водопровод по улици В. Бенева, Г. Стефанов, М. Стефанова, тласкател и помпена станция; канализационни клонове. Улиците са проходими с възстановени настилки, ул. М. Стефанова е възстановена с чакъл. Изпълняват се СМР по улици Г. Илиев, Русалка, Златарска, по които предстои засипване с чакъл и уплътняване.

Водопроводни връзки Горнокрайски и Баев мост
Дере Хлебозавод
Водоеми висока зона



ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВОИЗГРАДЕНА МРЕЖА:

Всички участъци с изпълнени проводи са в експлоатация, т.е. с превързани сградни отклонения.



КРИТИЧНИ ТОЧКИ за зимния сезон:

Приоритетна работа по подобряване на проходимостта на кв.
Баждар – улици Тракия и Хаджи Димитър

Приоритетна работа по подобряване на проходимостта на кв.
Златари – ул. Златарска



ЕТАП 2

СТАНИЛОВ ЕООД

Начало на строителството: 19.10.2012 г.

Край на строителството: 11.06.2014 г.

Стойност на договора – 17.6 млн. лв. с ДДС -
обща стойност 15. 7 млн. лв. с ДДС – стойност
по ОПОС



Етап 2 – изпълнени са:

Централна градска част – водопроводи по улици Чардафон, В. Михайлов, Ив. Вазов, Драва, Л. Донков, Д. Карталов, Македония, Кирил и Методий, П. Семов, Успех, Вардар, Подуево, Република, Кукуш, Ю. Скайлър, Лале, В. Априлов, Брянска (от Консултативна пол. До ЖП гара), Радецка; канализационна мрежа по ул. Братя Миладинови, Л. Каравелов, Градище. Възстановени са настилките по улици Чардафон, Македония, Л. Донков, Драва, Ив. Вазов, Д. Карталов, Република. Необходимо е поддържане – изравняване и уплътняване на траншеите на останалите, особено по ул. Кирил и Методий. Необходимо е изравняване на неравностите по бул. Априлов.

Кв. Лъката и Камъка – водопроводи по улици Стефана Б. Генчева, Камъка, Кръгозор, Разцветна, Турист, Извора, Орлово гнездо, Народна Воля, Градище, Острец, Иван Димов, Ал. Керков, Луна, Хан Крум, Петър Берон, Любен Каравелов, Захари Стоянов, Орловска, Дунав, Шипка. Необходимо е поддържане – изравняване и уплътняване на траншеите на останалите, особено по ул. Шипка.



КРИТИЧНИ ТОЧКИ за зимния сезон:

Приоритетна работа по подобряване на проходимостта на централна градска част - бул. Априлов, ул. Кирил и Методий

Приоритетна работа по подобряване на проходимостта на кв. Лъката и Камъка – особено по улици Шипка, Стефана Богдан Генчева, Орловска, напречни улици на ул. Градище

Обезопасяване на всички изкопи с твърда метална ограда

Приоритетна работа по привързване на сградни отклонения



ЕТАП 3

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Начало на строителството: 18.08.2012 г.

Край на строителството: 18.08.2014 г.

Стойност на договора – 14.3 млн. лв. – обща стойност; 13.4 млн. лв. – стойност по ОПОС

Етап 3 – изпълнени са:

пътят на водата



Кв. Радичевец и Йонковото – водопроводи по улици Николаевска, Лиляна, Гимназиална, И. Тончев, Т. Иванов, Ц. Дюстабанов, П. Постомпиров, Стара планина, К. Иречек, Априловска, Първи май. Възстановени са изцяло настилките по улици Гимназиална и П. Постомпиров. По улици Ц. Дюстабанов, Стара планина, К. Иречек и Първи май се предвижда възстановяване по друг проект. Необходимо е подобряване на проходимостта по ул. Николаевска и Н. Рилски – изравняване със ситна фракция.

Кв. Беленци - водопроводи по улици К. Евтимов, Каменоломна, Беленска, Ведрина, Жълтешка, Габрака, Арчар, Чучура, канализационни клонове. Кварталът е проходим – запечатани траншеи с трошен камък. Необходимо е системно заравняване и поддържане на проходимостта.

Кв. Лисец – гл. колектор 1, канализационен клон 12, 13, 14, 15. Кварталът е проходим – запечатана траншея с трошен камък. Необходимо е системно заравняване и поддържане на проходимостта, особено за гл. колектор 1.

Дерета ВиК, Маркотей, Бялката, Хаджицонев мост



ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВОИЗГРАДЕНА МРЕЖА:

От участъци с изпълнени проводи, в експлоатация, т.е. с превързани сградни отклонения са улиците Гимназиална, П. Постомпиров, Т. Иванов, 2/3 от Николаевска, Ц. Дюстабанов, Стара планина, Първи май, К. Иречек.



КРИТИЧНИ ТОЧКИ за зимния сезон:

Приоритетна работа по подобряване на проходимостта на централна градска част – ул. Николаевска и Неофит Рилски

Приоритетна работа по поддържане на проходимостта на кв. Беленци

Приоритетна работа по засипване на 8 бр. изкопи след положителна хидравлична проба в кв. Любово

Приоритетна работа по привързване на сградни отклонения



Ограничени са строителните дейности по изкопни работи с цел приоритетна работа по осигуряване на проходимост и безопасност на участъците със завършени проводи. Не се допуска отваряне на нови строителни площадки с възлово местоположение.

Издадени са задължителни инструкции от Звеното за изпълнение на проекта и строителния надзор за всички отделни строителни обекти.

Санкционирани са изпълнителите, допуснали небезопасяване на отворени изкопи.

Благодарим за вниманието!

ОБЩИНА ГАБРОВО

Звено за изпълнение на проект

пътят на водата

тел.: 066/ 818 377

Факс: 066/809 371

office@waterprojectgabrovo.eu

www.waterprojectgabrovo.eu




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Инвестираме във Вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Решения за
по-добър живот

www.ope.moew.government.bg
